

42. Werkzeugeinsatz von Projekt- Management-Systemen (PMS)

1

Prof. Dr. Uwe Aßmann
Lehrstuhl Softwaretechnologie
Fakultät Informatik
TU Dresden
Version 13-1.0, 11.07.13

for your info;
left out in 2013

Literatur


- ▶ Ahlemann, F. Studie: PM-Software im Vergleich; <http://www.projektmagazin.de>
 - Das Fachmagazin im Internet für erfolgreiches Projektmanagement 2003
 - <http://www.projektmagazin.de/magazin/>
 - <http://www.pm-software-report.com/deutsch.html/>
- ▶ Überblicksliste über Tools (Stand Okt. 2010), mit vielen Beschreibungen
 - <http://www.pm-software.info/produktfilter.html>

Anforderungen an PM-Werkzeugsysteme

3


- Unterstützung des **gesamten** Projektzyklus:
 - **Projektorganisation**: Erfassung der Projektgrößen, wie Personal, Rechte usw.
 - **Projektplanung**: Strukturplanung; Ablaufplanung; Terminplanung, Ressourcenplanung, Kostenplanung, Aufwandsoptimierung; Risikomanagement
 - **Projektsteuerung**: Reagieren auf Differenzen zwischen Plan und Ist; Einwirken auf Projektmitglieder; Koordination; Qualitätssicherung
 - **Projektkontrolle**: Berichtswesen; Termin- und Kostenüberwachung; Projektcontrolling
 - **Projektverbesserung**: Prozessverbesserung
- Unterstützung von Groupware-Funktionen:
 - verteiltes Dokumentenmanagement; Meeting-Unterstützung, Gruppenbearbeitung von Dokumenten, Workflows ...
- Benachrichtigungssystem(Mailing) für Ressourcenanfragen, Mahner bei Terminverzügen, Versenden von Formularen, Änderungsanträge usw.
- Unterstützung:
 - Single-User- oder Multi-User-System
 - Single-Projekt- oder Multi-Projektsystem
 - Webfähigkeit

M-Modell - Bezugsrahmen für PMS

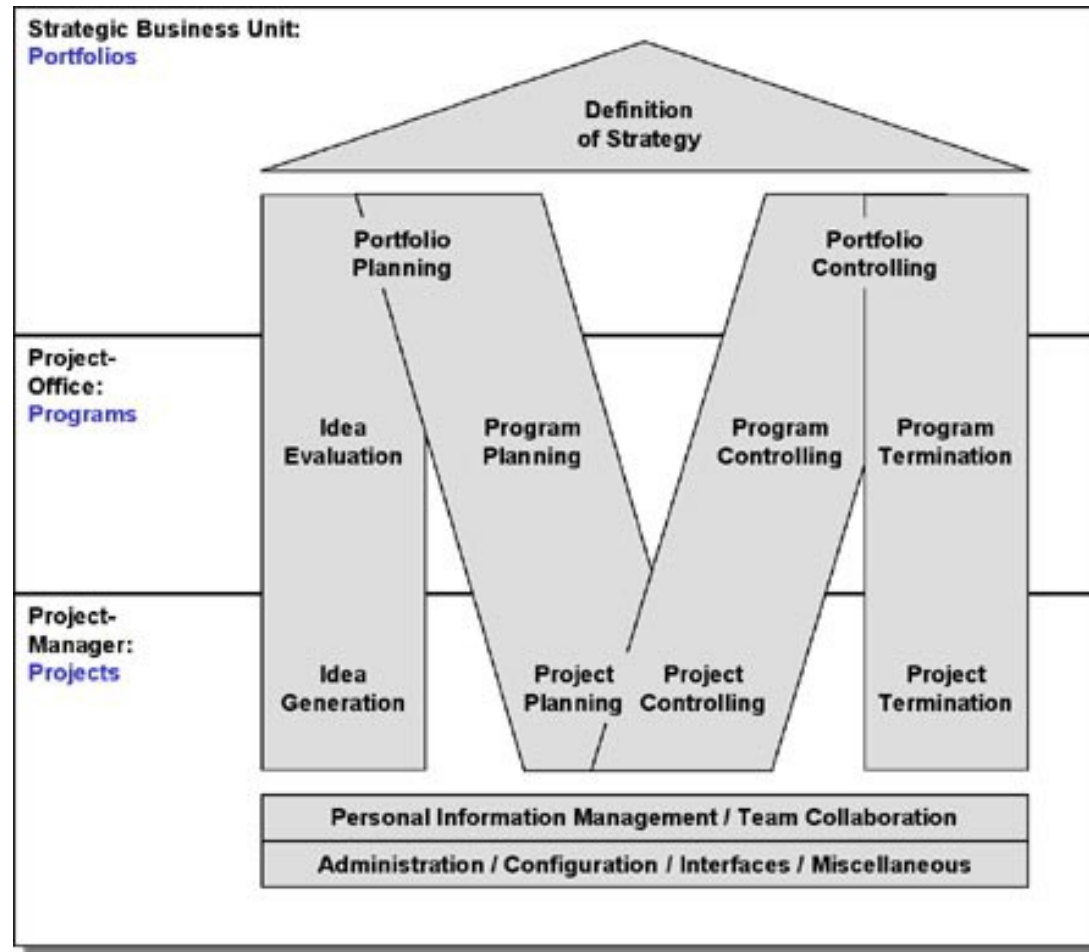

Quelle: Ahlemann, F.: Studie: PM-Software im Vergleich; <http://www.projektmagazin.de> - Das Fachmagazin im Internet für erfolgreiches Projektmanagement 2003

Klassen von PMS mittels M-Modell

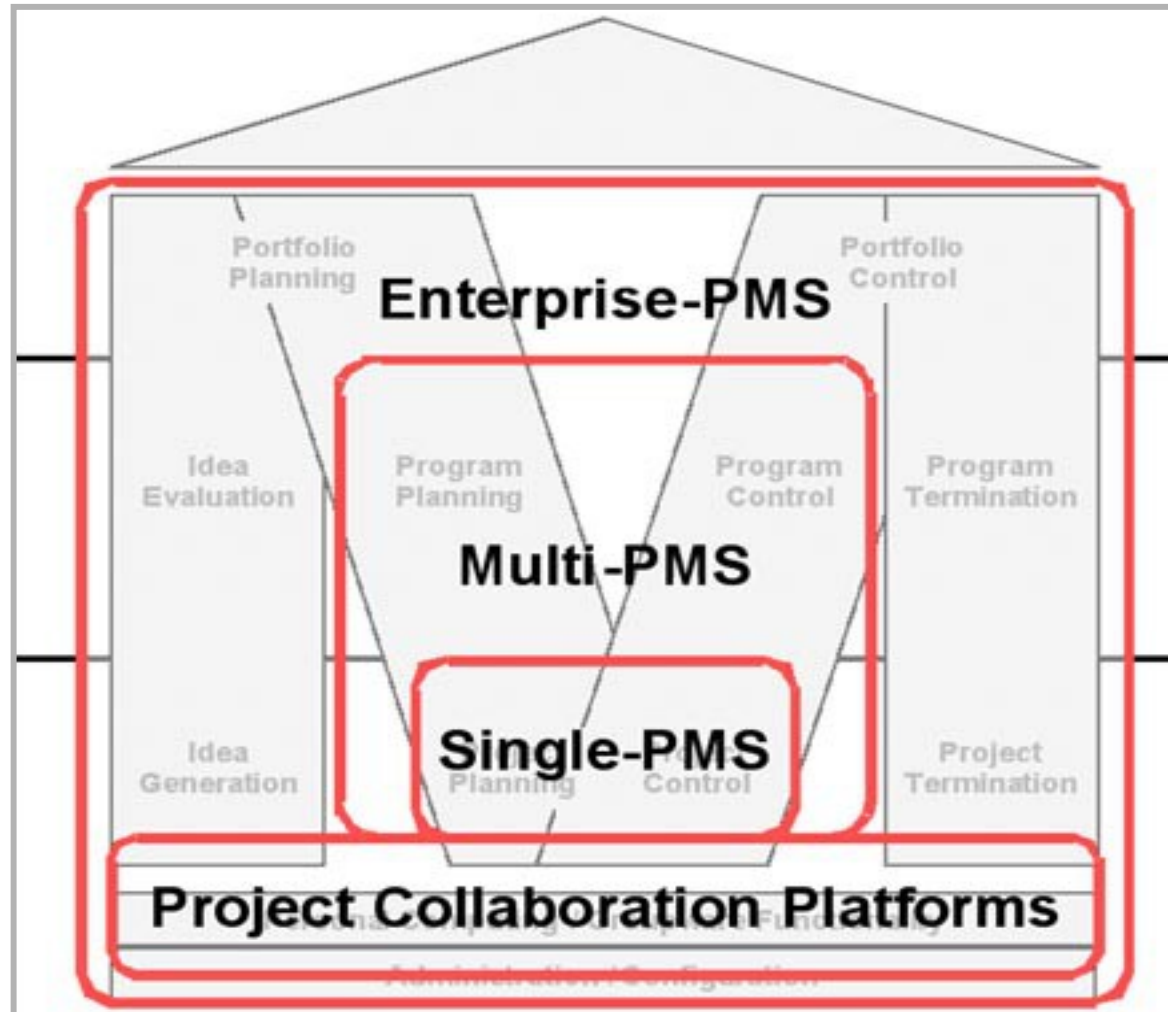

Quelle: Ahlemann, F.: Studie: PM-Software im Vergleich; <http://www.projektmagazin.de> - Das Fachmagazin im Internet für erfolgreiches Projektmanagement 2003

Auswahl von PM-Werkzeugsystemen

Weitere funktionelle Anforderungen an PM-Werkzeugsysteme sind:

- Generieren von Netzplänen, Dokumenten, Entscheidungsunterstützung
- Verwalten und Archivierung von Dokumenten
- Produktverwaltung, Versions- und Konfigurationsverwaltung
- Planungsfunktionen und –algorithmen
- automatische Kontrollfunktionen, Plan-/Ist-Vergleiche
- Auswerte- bzw. Tabellenkalkulationssysteme
- Ausgleichs- und Optimierungsalgorithmen
- maschinelle Kommunikation im Team

Der Markt bietet eine Vielzahl von Werkzeugen zur Unterstützung des Projektmanagements. Aufstellungen enthalten:

- www.managementsoftware.de
- www.softguide.de/software/projektmanagement.htm

Primavera P3e

Hersteller:

- Firma: Primavera Systems USA, jetzt ORACLE
- <http://www.oracle.com/primavera/index.html>

Wichtige Eigenschaften:

- Multiprojekt & Multiuser Projektmanagement-Software, bestehend aus verschiedenen Tools
- Funktionen zum Risikomanagement; Was-wäre-wenn Simulationen
- professionelle Projekt- und Ressourcen-Modellierungsmöglichkeiten
- Projektübergreifendes Ressourcenmanagement
- Kostenverfolgung
- Terminplanung auf globaler, Projekt- und Ressourcenebene
- Integriertes Risikomanagement
- Berichtswesen und Kommunikation
- Add-on:Progress Reporter: Web-basierend unterstützt die Zusammenarbeit des Projektteams über Web, LAN oder Email
- Skalierbar für unternehmensweites Projektmanagement

Primavera P3e/

▶ **Project Manager:**

- ▶ Kern der Primavera Enterprise Suite
- ▶ umfassende, Multiprojekt-unterstützende Kontrollsoftware
- ▶ ermöglicht die CPM Planung, Multiprojekt-Planung und Was-wäre-wenn-Kalkulationen (Risikomanagement)
- ▶ Erfassung der Auswirkungen von Änderungen der Ressourcenlimits, Aktivitätsprioritäten usw. mit Hilfe von Extended GANTT- und PERT-Diagrammen sowie anhand von Report-Wizards
- ▶ Terminplanung auf globaler, projekt- und Ressourcenebene bis ins Detail hinein
- ▶ Integriertes Risikomanagement

▶ **Cost Manager Tool:**

- ▶ Erweitertes Kostenmanagement
- ▶ Earned Value Analyse (Ertragswertanalyse) und Return on Investment (ROI) Analyse Fähigkeiten werden rechentechnisch unterstützt,
- ▶ Leistungstrends erkennen
- ▶ Statistische Schätzungen
- ▶ Verbesserte Information durch Graphische Darstellung und Verbreitung durch Primavision

Graneda Dynamic

Hersteller:

- NETRONICS Software GmbH

Wichtige Eigenschaften:

- Visualisiertes Projektmanagement direkt mit Grafikeditor im Netzplan
- Grafikergänzung für Projektarbeit und Präsentationen
- Projektdaten als Netz-, Baum- oder Gantt-Diagramm darstellen
- Visuelles „Weiterplanen“ mit der Maus am Bildschirm
- Projektdaten aus Planungssystem (z.B. Microsoft Project, CA-SuperProject usw.) laden, weiterplanen und die Planungsergebnisse in Projektdateien zurückschreiben

Projectplace

Hersteller:

- Projectplace Schweden

Wichtige Eigenschaften:

- Webbasiertes Projektmanagement-Tool
- unkomplizierte und effektive Zusammenarbeit der Projektmitarbeiter
- erlaubt als virtuelles Kommunikationszentrum Zugang zu gemeinsamen Projektdaten
- unterstützt Mitglieder eines Projekts bei Steuerung und Strukturierung ihres Vorhabens
- verfügbare Sprachen: Schwedisch, Englisch, Norwegisch, Niederländisch und Deutsch

URL:

- <http://www.projectplace.de>

Sciforma Project Scheduler 8

Hersteller:

- Le Bihan Consulting GmbH

Wichtige Eigenschaften:

- Kompletter Werkzeugkasten zum Planen, Steuern und Überwachen
- Multiprojektfähigkeit mit Projektportfolios
- Ressourcenplanung
- Kostenplanung, Überwachung und Steuerung
- Änderungen im Projektplan dokumentiert der Project Scheduler, indem er den jeweils aktuellen Planungsstand als Basisplan sichert
- Berichte in allen Varianten und Formaten
- Unterstützung der Planungsmethode Critical Chain
- Web-basierte Projektplanung mit dem Web-Site Manager
- Skalierbarkeit vom Einzelplatz bis zur PS Suite

Progress Reporter

Überblick:

- Web-basierend
- Tool für die Zusammenarbeit des ganzen Projekt-Teams
- Multibenutzer-, Multiprogramm-, Multiprojektfähigkeit
- Arbeitszeit-Report
- Kommunikation innerhalb des Teams

Progress-Reporting:

- Einfach zu benutzendes Timesheet-Interface
- Fortschritts-Report
- Mehr Details zu den Aufgaben können gespeichert und verarbeitet werden
- Nachfrage nach mehr Ressourcen
- Mitteilen des Arbeitsaufwandes bei abgeschlossenen Aufgaben(Proj.tagebuch)
- Überprüfen übermittelter Timesheets vor Rückübertragung ins System

Collaboration:

- Übermitteln von benötigten Informationen, um Tasks zu beenden
- Projektmanager kann Mitarbeitern Notizen zukommen lassen
- Link zur Projekt-Website für detailliertere Informationen
- Automatische Zuweisung von neuen Ressourcen zu Tasks

Artologik

- ▶ Aus Väjö, Schweden
- ▶ Webbasiert
- ▶ Ressourcenplanung
- ▶ Berichtswesen (Zeit-, Ergebnisberichte)
- ▶ Projektplan (GANTT)
- ▶ Zeitregistrierung (Gleitzeit, Überstunden, etc.)

<http://www.pm-software.info/produktdetail/123/index.html>



Microsoft Internet Explorer - Skyway Courier Expansion

Arxiv Redigera Visa Favoriter Verkyg Hjälp

← Bakåt → → Gå till Länkar »

Adresse

Projekte **Projektverwaltung** Berichte Verwaltung Handbuch

Status: Aktiv Kunde: Skyway Courier Projekt: Skyway Courier Expansion - 3 Nr / ID / Name: Suchen Hilfe

Skyway Courier Expansion 060504 060728 179:00 Tag Woche Monat

Phase/Aktivität	Beginn	Ende	Zeit	%	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Research	060504	060528	71:00																
Methodology	060504	060513	18:00																
Martin Austin	060504	060513	10:00	20%															
Jason Green	060504	060513	8:00	13%															
Data Collection	060514	060521	20:00																
Martin Austin	060514	060521	10:00	28%															
Jason Green	060514	060521	060514 - 060521																
Data Analysis	060521	060525	Martin Austin																
Martin Austin	060521	060525	Plan / Arbeitsstunden = %																
Jason Green	060521	060525	11:15 40:00 28%																
Reports	060526	060528	15:00																
Martin Austin	060526	060528	5:00	65%															
Sandra Bernd	060526	060528	5:00	97%															
Jason Green	060526	060528	5:00	50%															
Media	060528	060627	63:00																
Print	060528	060627	33:00																
Martin Austin	060528	060627	8:00	13%															
Max Johnson	060528	060627	10:00	999%															
Amy Schwarz	060528	060627	15:00	999%															
Television	060528	060627	30:00																
Martin Austin	060528	060627	10:00	13%															
Max Johnson	060528	060627	5:00	999%															
Amy Schwarz	060528	060627	15:00	999%															
Presentations	060627	060723	46:00																
Powerpoint	060627	060708	20:00																
Martin Austin	060627	060708	5:00	22%															
Sandra Bernd	060627	060708	10:00	23%															
Amy Schwarz	060627	060708	5:00	999%															
Final presentation	060708	060723	25:00																

Benutzergruppe: Alle

Benutzer: Alle

Geplante Überstunden (rot)

Geplante Zeit (schwarz)

Arbeitszeit (blau)

500
400
300
200
100
0

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Einstellungen Ganzer Bildschirm Speichern

2006-06-07 Woche 23

Abmeldung

Applet: GantApplet started

Internet

ProjectManager

- Basisdaten
- Mitglieder
- Dokumente
- Zeit planen**
- Alle Phasen
- Research
- Media
- Presentations

Artologik SOFTWARE FOR THE WEB

MicroTool InStep (Berlin)

- ▶ Projektplanung (Ablauf, Ressourcen, Termine, Aktivitäten)
- ▶ Anforderungs-, Änderungs-, Konfigurationsmanagement
- ▶ Qualitäts-, Test-, Risikomanagement
- ▶ unterstützt die Prozessmodelle SCRUM, VMXT, SPICE, PRINCE2, HERMES

The screenshot shows the 'in-Step' software interface. The window title is 'in-Step [C:\in-Step Systems\Multiprojektmanagement Tutorial.isf - Virtual Guide - Mark Mondrian] - [Projektplan ...]'. The menu bar includes 'System', 'Projekt', 'Extras', 'Dokumentation', 'Fenster', and 'Hilfe'. The sidebar on the left contains the following sections:

- My in-Step
- Projektmanagement
- Anforderungsmanag...
- Änderungsmanagem...
- Änderungsmanagem...
- Qualitätsmanagement
- Risikomanagement
- Konfigurationsmana...
- Reviews

The main workspace displays a Gantt chart for the period from February 16, 2011, to March 7, 2011. The chart shows the following tasks and their statuses:

Name	Zustand	Februar 2011		März 2011				
		KW 7	KW 8	KW 9	w 1			
Virtual Guide	in Bearbeitung	16	19	22	25	1	4	7
Projektbeschreibung erstellen	durchgeführt							
Projektbeschreibung erstellt	erreicht							
Konzeption	in Bearbeitung							
Pflichtenheft erstellen	in Bearbeitung							
Ausstellungsdaten analysieren	bereit							
Konzept erstellt	geplant							
Prototyp	geplant							
Produkt	geplant							
Installation	geplant							

The End
